



Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (5.5.1.0/17/I/003)

Finansējuma saņēmējs:

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils muzejs



Projekta sadarbības partneri:

- Ventspils novada pašvaldība,
- Jūrkalnes Romas katoļu draudze,
- Dundagas novada pašvaldība.



Projekta kopējais finansējums 5,4 miljoni eiro, t.sk. ERAF 4,2 miljoni eiro

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ




Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (5.5.1.0/17/I/003)

Projekta mērķis

Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma objektus Ziemeļkurzemē, vienlaikus radot priekšnoteikumus tūrisma plūsmas pieaugumam Ziemeļkurzemē.

Projekta īstenošana

Vienošanās 17.01.2018. (īstenošanas laiks – 16.11.2020.)
Līguma grozījumi 19.02.2019.
(īstenošanas laiks pagarināts – 16.05.2021.)

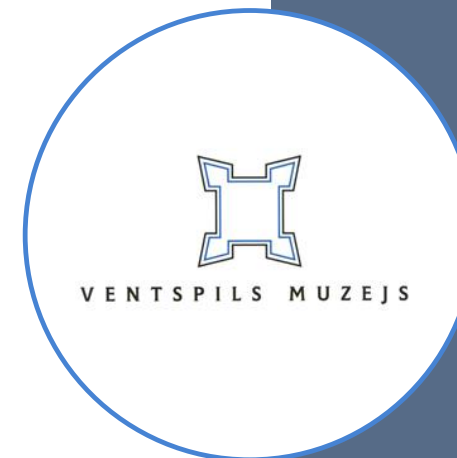

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020




EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (5.5.1.0/17/I/003)

Kopsavilkums par projektu uz 16.04.2019.

| Finansējuma avots | Summa | % | Izpilde | Atlikums |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| ERAF | 4 225 500,00 | 79,81 | 769 665,06 | 3 455 834,94 |
| Valsts budžeta finansējums | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Valsts budžeta dotācija pašvaldībām | 165 500,28 | 3,13 | 29 328,62 | 136 171,66 |
| Pašvaldības finansējums | 623 559,69 | 11,78 | 115 318,07 | 508 241,62 |
| Cits publiskais finansējums | 274 500,00 | 5,18 | 49 999,54 | 224 500,46 |
| Nacionālais publiskais finansējums | 1 063 559,97 | 20,09 | 194 646,23 | 868 913,74 |
| Publiskās attiecināmās izmaksas | 5 289 059,97 | 99,90 | 964 311,29 | 4 324 748,68 |
| Privātās attiecināmās izmaksas | 5 057,68 | 0,1 | 0,00 | 5 057,68 |
| Kopējās attiecināmās izmaksas | 5 294 117,65 | 100,00 | 964 311,29 | 4 329 806,36 |
| Publiskās neattiecināmās izmaksas | 514 432,54 | | | |
| Privātās neattiecināmās izmaksas | 69 520,45 | | | |
| Kopējās neattiecināmās izmaksas | 583 952,99 | | | |
| KOPĒJĀS IZMAKSAS | 5 878 070,64 | | | |

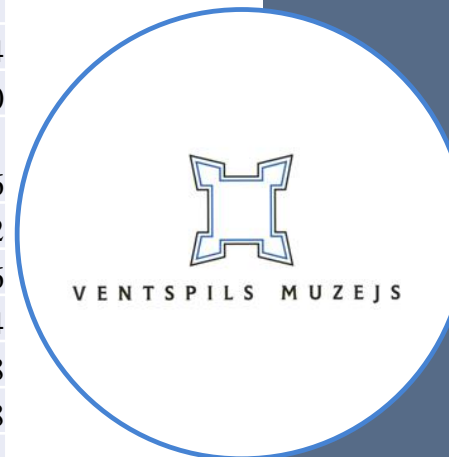



Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (5.5.1.0/17/I/003)



Ventspils muzeja īstenojamās darbības

Piekrasti raksturojošās dabas ainavas – infrastruktūra Ventspilī, dienvidrietumu rajonā, Pelēkās kāpas sasniedzamībai un saglabāšanai (3.)

| Projekta darbība | Darb. Nr. | Statuss |
|---|-----------|---|
| Pelēkās kāpas sasniedzamības un dabas mantojuma aizsardzības infrastruktūras izbūve | 3.1. | Īstenots. Izbūvēti apvienotie gājēju/veloceliņi ar apgaismojumu, skatu laukumiem - viss plānotais apjoms. Objekts nodots ekspluatācijā 20.09.2018. SIA "Ostas celtnieks". |
| Būvuzraudzība | 3.2. | Īstenots. SIA "Pro CAD". |



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (5.5.1.0/17/I/003)



Ventspils muzeja īstenojamās darbības - Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja apbūve (4.)

| Projekta darbība | Darb. Nr. | Statuss |
|--|-----------|--|
| Jaunas daudzfunkcionālas PBM ēkas izbūve | 4.1. | Plānots, notiek iepirkuma dokumentācijas gatavošana |
| Būvprojekta sagatavošana | 4.4. | Īstenošanā, Projektētājs SIA "Balts un Melns", līgums 19.01.2018.; saskaņots būvprojekts minimālajā sastāvā 19.09.2018.; projektēšanas darbus plānots pabeigt līdz 19.04.2019. |
| Būvprojekta ekspertīze | 4.5. | Īstenošanā, SIA "VPM Latvia, līgums 18.02.2019. |
| Autoruzraudzība | 4.6. | Nav uzsākts |
| Būvuzraudzība | 4.7. | Nav uzsākts |
| PBM ēkas 4 telpu aprīkošana un pielāgošana | 4.2. | Nav uzsākts |
| PBM pastāvīgās ekspozīcijas izveide | 4.3. | Īstenošanā, Izstrādātājs SIA "Dd Studio", līgums 21.01.2019.; ekspozīcijas mākslinieciskā projekta izstrāde - 2019. jūlijs; realizācija 2021.g. janvāris. |



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ




Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (5.5.1.0/17/I/003)

Dundagas novada pašvaldības īstenojamās darbības

Lībiešu kultūrtelpa – "Līvu saieta nams" ēkā "Pastnieki" Kolkā (5.3.)



| Projekta darbība | Darb. Nr. | Statuss |
|--|-----------|--|
| "Lībiešu saieta nama" aprīkošana darbības nodrošināšanai | 5.3.1. | Īstenots. 09.03.2019. notika ēkas "Pastnieki" Dundagas novadā (Kolkā) atklāšana. Veikta mēbeļu un aprīkojuma iegāde. Dažādi piegādātāji. |

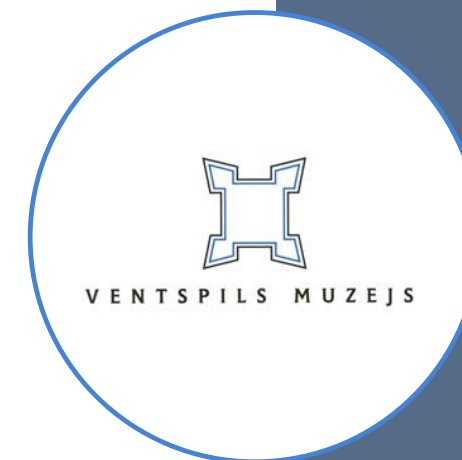

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (5.5.1.0/17/I/003)

Dundagas novada pašvaldības īstenojamās darbības

Kultūras piemineklis – Dundagas pils (6.)

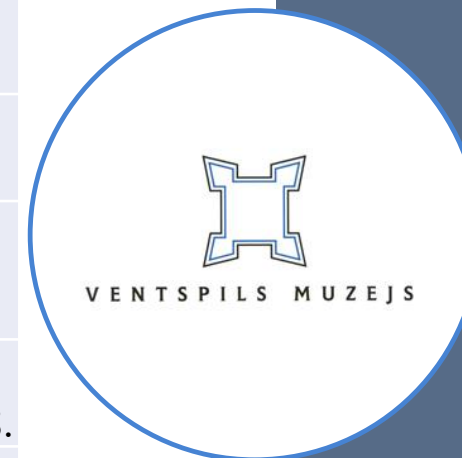

| Projekta darbība | Darb. Nr. | Statuss |
|--|-----------|---|
| Dundagas pils telpu pārbūve | 6.1. | Īstenošanā, Būvdarbu veicējs SIA "R.A.J.", līgums 22.03.2019. |
| Būvprojekta sagatavošana | 6.4. | Īstenots, Projektētājs SIA "Livland Group", līgums 07.03.2018. Realizēts 28.09.2018. |
| Būvprojekta ekspertīze | 6.5. | Īstenots, SIA "TOTUS", līgums 17.07.2018. Izpildīts 28.09.2018. |
| Autoruzraudzība | 6.6. | Īstenošanā, SIA "Livland Gruop", līgums 07.03.2018. |
| Būvuzraudzība | 6.7. | Īstenošanā, SIA "Būves un būvsistēmas", līgums 26.03.2019. |
| Pārbūvēto Dundagas pils telpu aprīkošana | 6.2. | Nav uzsākts |

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ




Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (5.5.1.0/17/I/003)



Ventspils novada pašvaldības īstenojamās darbības

Suitu kultūrtelpa – Jūrkalnes dabas un atpūtas parka pilnveidošana (2.)

| Projekta darbība | Darb. Nr. | Statuss |
|---|------------------|--|
| Koncertzāles “Vējturu nams” ēkas izbūve | 2.1., 2.2., 2.3. | Īstenošanā, Būvdarbu veicējs SIA "Būvfirma INBUV", tiek gatavots līgums. |
| Būvprojekta sagatavošana | n/a | Īstenots, Projektētājs SIA "BM Projekts". Realizēts. |
| Autoruzraudzība | 2.4., n/a | Īstenošanā, SIA "BM Projekts", līgums noslēgts 15.12.2017. |
| Būvuzraudzība | 2.5. n/a | Īstenošanā, SIA "PBT", līgums 26.03.2019. |

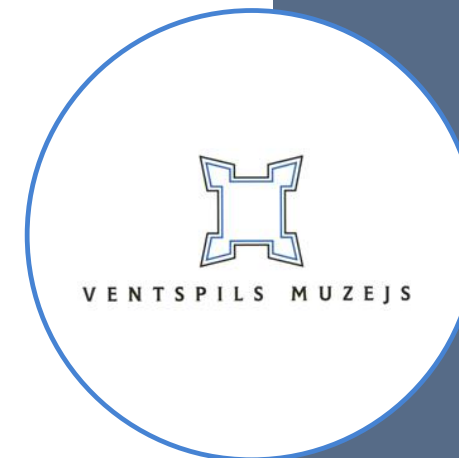

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ




Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (5.5.1.0/17/I/003)



Ventspils novada pašvaldības īstenojamās darbības

Lībiešu kultūrtelpa – gājēju un velosipēdistu tilts pār Irbes upi (5.2.)

| Projekta darbība | Darb. Nr. | Statuss |
|--------------------------|------------|--|
| Trošu tilta pārbūve | 5.2.1. | Īstenošanā, pēc precizējumu veikšanas iepirkuma nolikumā, tiks atkārtoti sludināts iepirkums apvienotajam iepirkumam uz projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību, notiek iepirkumu dokumentācijas aktualizēšana. Iepirkumu plānots izsludināt aprīlī. |
| Būvprojekta sagatavošana | 5.2.2. n/a | Iepriekš izstrādātais būvprojekts sadārdzinājuma dēļ nav realizējams. |
| Autoruzraudzība | 5.2.3. n/a | Nav uzsākts |
| Būvuzraudzība | 5.2.4. n/a | Nav uzsākts |

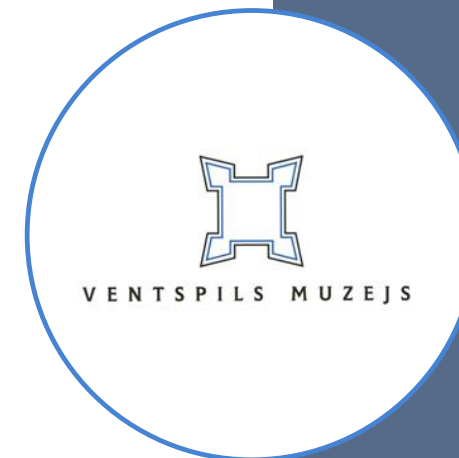




Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (5.5.1.0/17/I/003)



Ventspils novada pašvaldības īstenojamās darbības

Lībiešu kultūrtelpa –ventiņu-lībiešu gājēju un velosipēdu celiņš (5.1.)

| Projekta darbība | Darb. Nr. | Statuss |
|----------------------------|------------------|--|
| Gājēju – veloceliņa izbūve | 5.1.1. | Īstenošanā, līgums SIA "VENTA 1", līgums 03.12.2018. |
| Būvprojekta sagatavošana | 5.1.2. n/a | Īstenots, SIA "SNB projekti," 22.01.2018. |
| Autoruzraudzība | 5.1.3. n/a | Īstenošanā, SIA "SNB projekti," 22.01.2018. |
| Būvuzraudzība | 5.1.4. n/a | Īstenošanā SIA "PBT" , līgums 07.12.2018. |

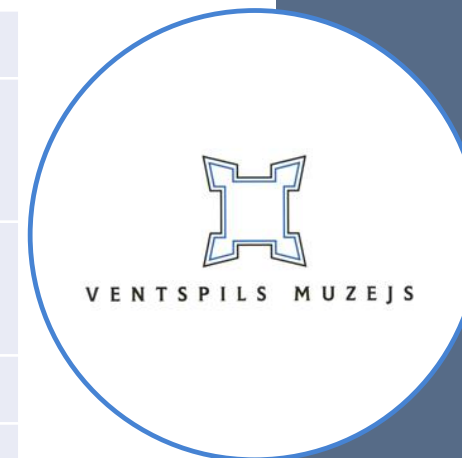

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (5.5.1.0/17/I/003)



Jūrkalnes Romas katoļu draudzes īstenojamā darbība

Kultūras piemineklis – Jūrkalnes Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcas ēkas atjaunošana (1.)

| Projekta darbība | Darb. Nr. | Statuss |
|--|------------------|---|
| Jūrkalnes Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcas ēkas atjaunošana | 1.1. | Izstrādāts būvprojekts (n/a), 24.10.2018 būvprojekts apstiprināts Ventspils novada Būvvaldē. Veikta tirgus izpēte būvniecības darbiem. Tiek veikta projektā paredzēto darbu pārskatīšana, no apjomiem izņemot būvdarbu sagatavošanas darbus, kurus iespējams veikt sabiedriskā kārtā vai sadarbībā ar Jūrkalnes pagasta pārvaldi, tādējādi samazinot plānotās būvdarbu izmaksas. Tiks veikta atkārtota cenu aptauja (tirgus izpēte), tās orientējošais termiņš – 2019.gada aprīlis. |
| Jūrkalnes Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcas ēkas labiekārtošana | 1.2. | |



Paldies par uzmanību!

Ilva Zavicka,
Ventspils muzeja projektu vadītāja
tel. 26 425 457
ilva.zavicka@ventspils.lv

